Календарный график строительства
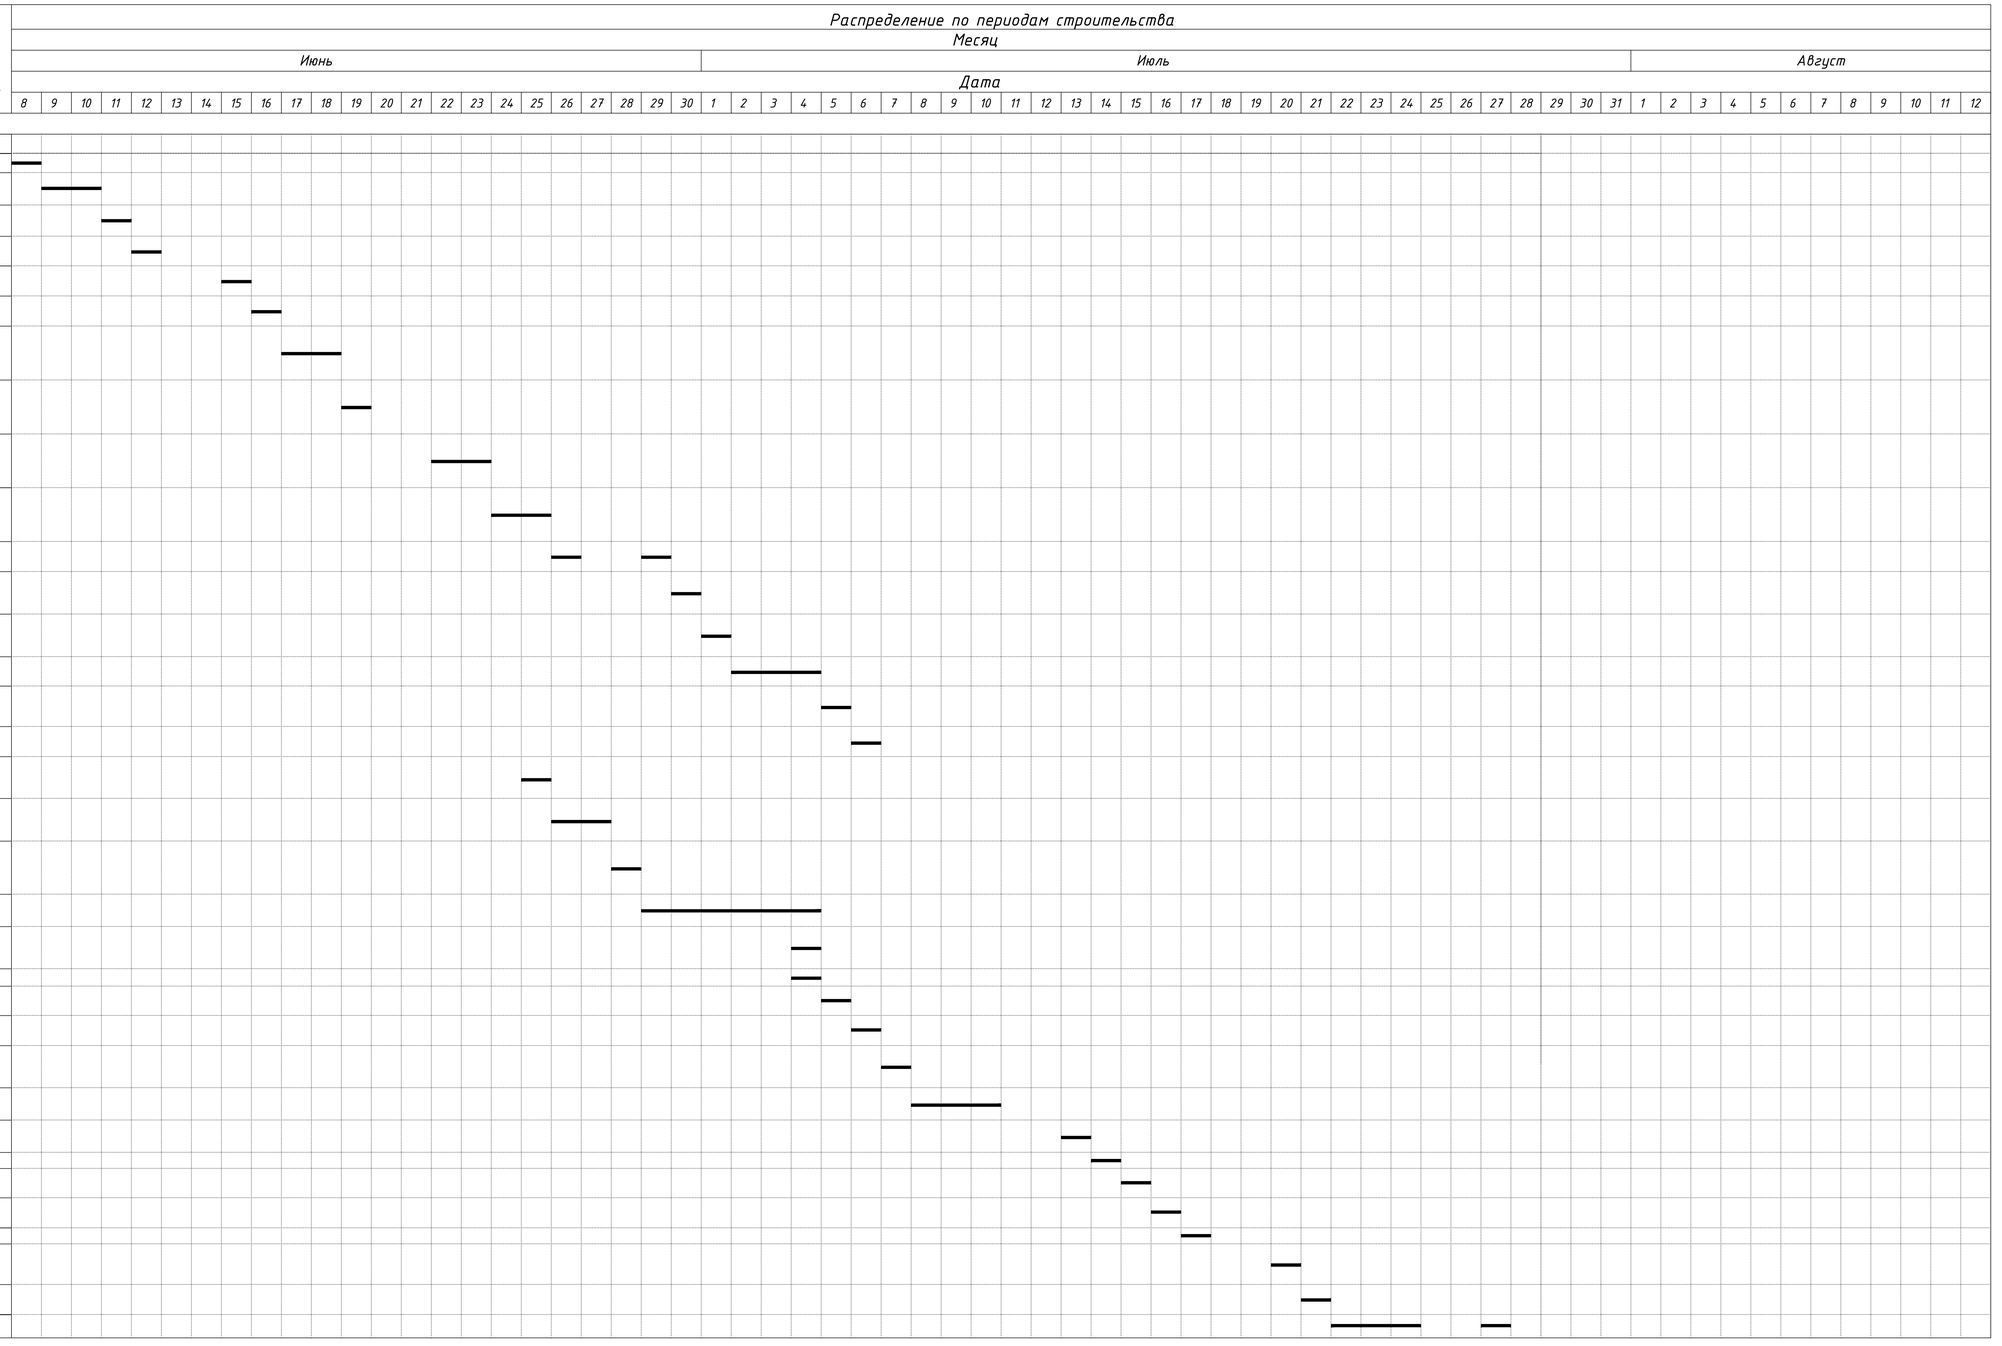
№ п/п	Наименование работ	Состав бригады	Продолжительность работ, дни
	Дождевая канализация		
85	Разметка трассы на площадке	Геодезист – 2 чел.	1
86	Устройство траншей с креплением стенок деревянными щитами на участке от решетки Д-1 до колодца К2-3	Машинист – 1 чел, пом. машиниста – 1 чел. монтажник – 3 чел.	2
87	Сборка (стыковка) звеньев трубопроводов на бровке траншеи на участке от решетки Д-1 до колодца К2-3	Монтажник – 3 чел.	1
88	Монтаж трубопроводов в траншею на участке от решетки Д-1 до колодца К2-3	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
89	Демонтаж деревянных щитов и обратная засыпка траншей на участке от решетки Д-1 до колодца К2-3	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
90	Восстановление нарушенных покрытий, благоустройство территории	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
91	Устройство траншей с креплением стенок деревянными щитами на участках: от колодца К2-3 до колодца К2-6, выпуск из здания №1 до колодца К2-3, выпуск из здания №1 до колодца К2-4	Машинист – 1 чел, пом. машиниста – 1 чел. монтажник – 3 чел.	2
92	Сборка (стыковка) звеньев трубопроводов на бровке траншеи на участках: от колодца К2-3 до колодца К2-6, выпуск из здания №1 до колодца К2-3, выпуск из здания №1 до колодца К2-4	Монтажник – 3 чел.	1
93	Монтаж трубопроводов в траншею на участках: от колодца К2-3 до колодца К2-6, выпуск из здания №1 до колодца К2-3, выпуск из здания №1 до колодца К2-4	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	2
94	Демонтаж деревянных щитов и обратная засыпка траншей на участках: от колодца К2-3 до колодца К2-6, выпуск из здания №1 до колодца К2-3, выпуск из здания №1 до колодца К2-4	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	2
95	Восстановление нарушенных покрытий, благоустройство территории	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	2
96	Устройство траншей с креплением стенок деревянными щитами на участке от колодца К2-6 до колодца К2-7	Машинист – 1 чел, пом. машиниста – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
97	Сборка (стыковка) звеньев трубопроводов на бровке траншеи на участке от колодца К2-6 до колодца К2-7	Монтажник – 3 чел.	1
98	Монтаж трубопроводов в траншею на участке от колодца К2-6 до колодца К2-7	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	3
99	Демонтаж деревянных щитов и обратная засыпка траншей на участке от колодца К2-6 до колодца К2-7	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
100	Восстановление нарушенных покрытий, благоустройство территории	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
101	Разработка стартового котлована с вертикальным креплением стенок деревянными щитами в районе колодца К2-8	Машинист – 1 чел, пом. машиниста – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
102	Устройство в стартовом котловане монолитной упорной стенки для гидравлических домкратов силового оборудования	Монтажник – 3 чел.	3
103	Монтаж в стартовый котлован силового оборудования для производства закрытой проходки методом продавливания на участке от колодца К2-8 до колодца К2-7	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
104	Устройство закрытой проходки методом продавливания на участке от колодца К2-8 до колодца К2-7	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	6
105	Разработка приемного котлована с вертикальным креплением стенок деревянными щитами в районе колодца К2-7	Машинист – 1 чел, пом. машиниста – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
106	Монтаж колодца К2-7	Машинист-1 ч., монтажник-3 ч.	1
107	Демонтаж креплений приемного котлована из деревянных щитов и обратная засыпка	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
108	Восстановление нарушенных покрытий, благоустройство территории в районе колодца К2-7	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
109	Разработка приемного котлована с вертикальным креплением стенок деревянными щитами в районе колодца К2-9	Машинист – 1 чел, пом. машиниста – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
110	Устройство закрытой проходки методом продавливания на участке от колодца К2-8 до колодца К2-9	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	3
111	Демонтаж из стартового котлована силового оборудования	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
112	Монтаж колодца К2-8	Машинист-1 ч., монтажник-3 ч.	1
113	Демонтаж креплений стартового котлована из деревянных щитов и обратная засыпка	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
114	Восстановление нарушенных покрытий, благоустройство территории в районе колодца К2-8	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
115	Монтаж колодца К2-9	Машинист-1 ч., монтажник-3 ч.	1
116	Демонтаж креплений приемного котлована в районе колодца К2-9 из деревянных щитов и обратная засыпка	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
117	Восстановление нарушенных покрытий, благоустройство территории в районе колодца К2-9	Машинист – 1 чел. монтажник – 3 чел.	1
118	Испытание трубопроводов	Монтажник – 3 чел.	4
